

Construcción de red de drenaje en Col. Ampliación los Filtros Calle Nogales entre camino a Filtros y Claves.

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
<https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp>

SHCP Seguimiento y Control
 Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S Ciclo: 2016

Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
 Gestión de Proyectos
 Gestión de Proyectos
 Avances
 Consultas y Reportes
 Nivel Financiero
 Consultas - Reportes
 Ficha Técnica de Indicadores
 Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2015	\$526,681.08	\$526,681.08	\$526,681.08	\$526,681.08	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						


Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales	384.00	%100.00	Obra al 100%
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales			
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Cancelar Suspender/Activar Terminar

ES 11:50 a.m. 14/04/2016

Construcción de red de drenaje en Col. Ampliación los Filtros Calle Nogales entre camino a Filtros y Claves.

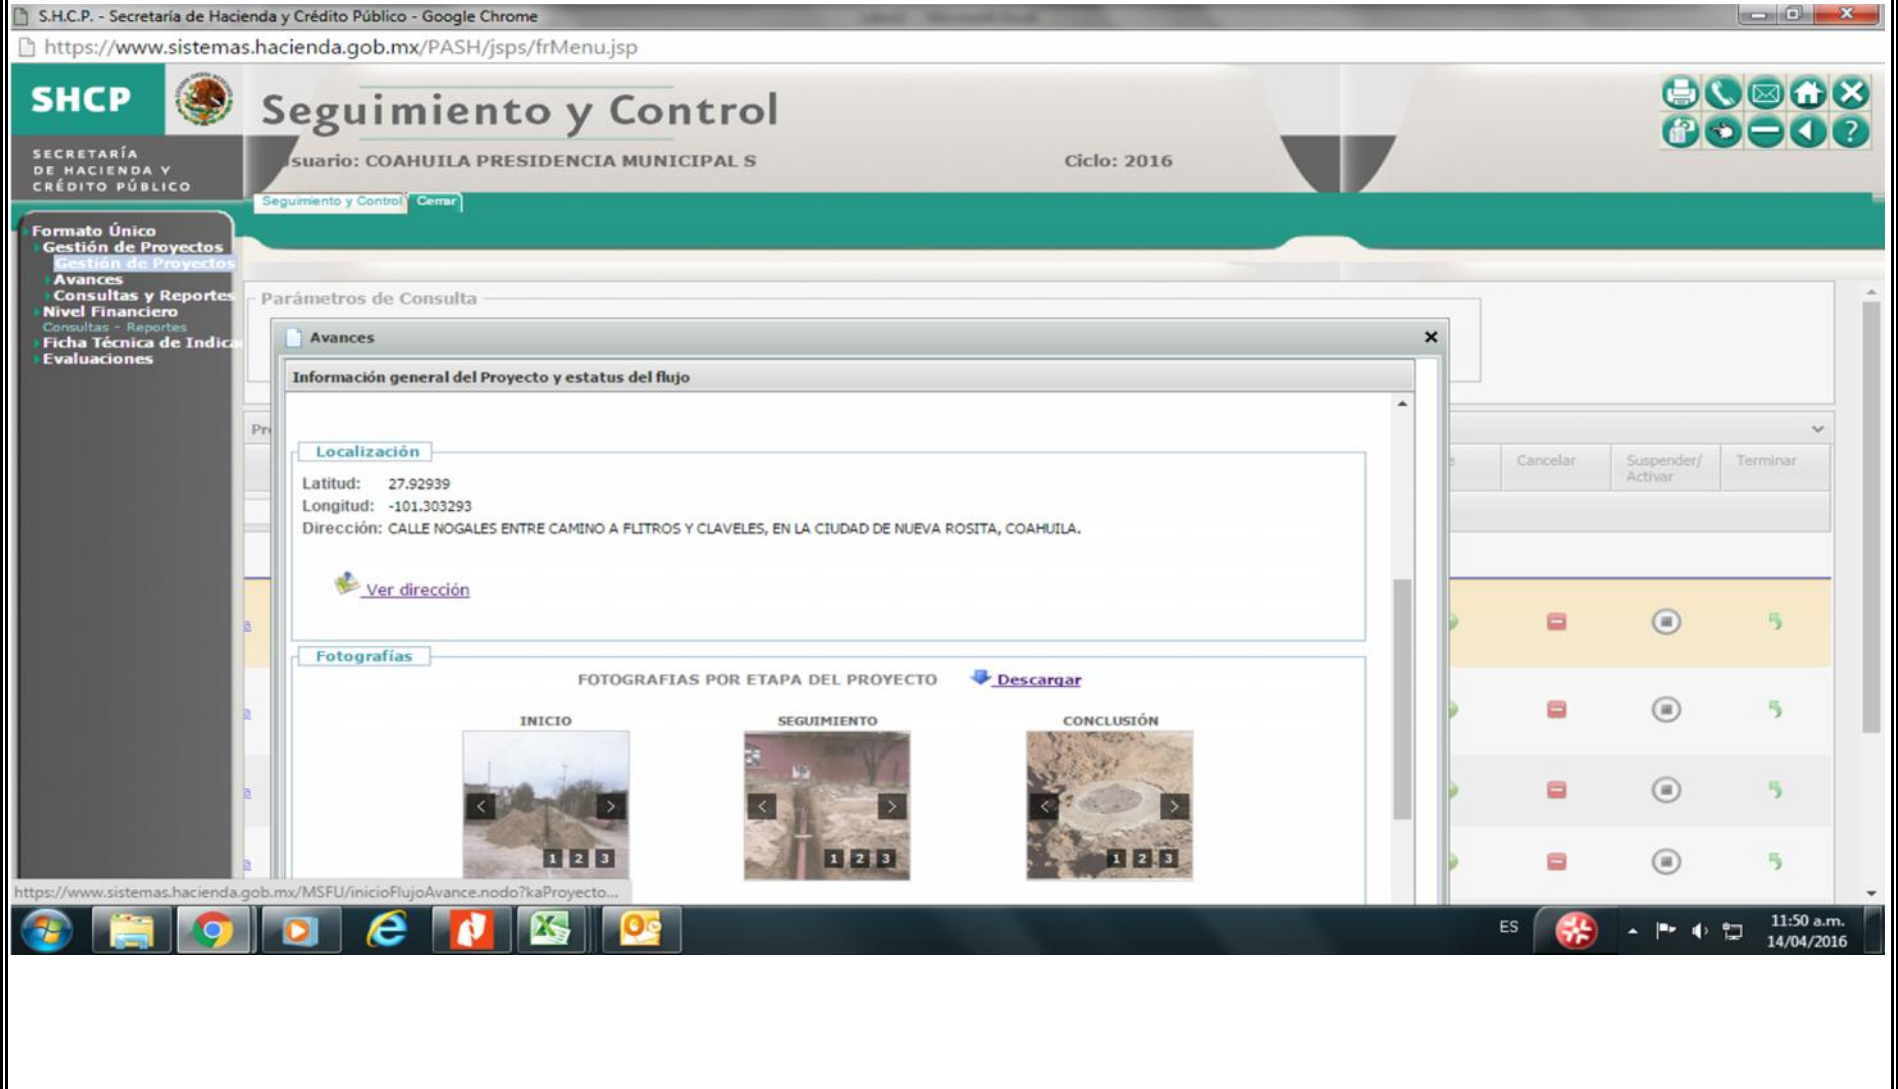

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

SHCP Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S Ciclo: 2016

Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicadores
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización
Latitud: 27.92939
Longitud: -101.303293
Dirección: CALLE NOGALES ENTRE CAMINO A FLITROS Y CLAVELES, EN LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA, COAHUILA.

Ver dirección

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO Descargar

INICIO SEGUIMIENTO CONCLUSIÓN

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Cancelar Suspender/Activar Terminar

ES 11:50 a.m. 14/04/2016

Construcción de red de drenaje en Col. Ampliación los Filtros Calle Nogales entre camino a Filtros y Claves.

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

SHCP Seguimiento y Control
 Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S Ciclo: 2016

Formato Único
 Gestión de Proyectos
 Avances
 Consultas y Reportes
 Nivel Financiero
 Consultas - Reportes
 Ficha Técnica de Indicadores
 Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	004/FISM/2015	CONSTRUCCIONES RENTA Y COMPRA VENTA SA DE CV	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	\$535,644.00	\$526,681.08
Total:				\$535,644.00	\$526,681.08

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Revisión Entidad Federativa

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2016-04-14 11:50:11	Primer Trimestre	Obra terminada al 100% Fi

ES 11:50 a.m. 14/04/2016
